


中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫案

- 一、計畫源起：本案緣於臺中清泉崗機場於「中部國際機場第一期發展計畫第一階段工程」案內興建之新國際航廈，於102年4月11日啟用投入營運後，既有航廈之內裝設備與新國際航廈相比，顯為老舊，影響旅客對機場之整體觀感，經本局對中部國際機場既有航廈之整建課題評估，並經報行政院核定後，辦理是項工程計畫。
- 二、計畫依據：行政院103年1月27日院授主基綜字第1030200069號函。
- 三、計畫總經費：約7.07億元，復於107年10月17日奉行政院核定修正計畫在案，修正總經費9.9872億元。
- 四、計畫期程：104-111年。
- 五、計畫內容：
 - (一)、航廈外觀整體性的協調
 - (二)、室內空間整合彈性運用
 - (三)、空側與航廈有效率相互配合
 - (四)、改善原有機電系統，增加節能、減碳相關效益
 - (五)、提升航廈旅客容量，發揮航廈容量之使用效率
 - (六)、取得銀級綠建築標章 + 合格級智慧建築標章

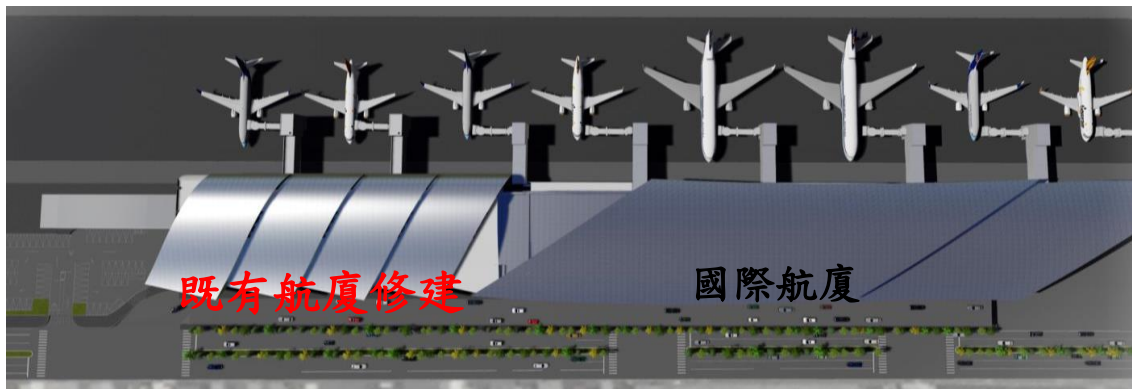

六、計畫辦理情形：本工程業於108年10月26日開工，分三階段施工，本案109年已完成臨時到離站區、拆除工程，截至110年9月，已進入第二階段工程，工程進度約58%，已完成鋼構工程，目前刻正進行屋頂封版、帷幕及機電工程。
